

전라남도  
진도군

# 금호호-군내호지구 농촌용수이용체계재편사업

2024. 10



한국농어촌공사 진도지사

# 금호호-군내호지구 농촌용수이용체계재편사업 현황

## ■ 사업 개요


- 위 치 : 전남 진도군 군내면, 해남군 문내면 일원
- 수혜면적 : 1,348ha (기존1,175,신규 84, 보강 89)
- 주요공사
  - 양수장 1개소, 토출수조 1개소, 송수관로
  - 울돌목 양수장 : 1개소 (300mm×170Kw×2대, Q=0.32m³/s)
  - 송수관로 : 1조 17.04km(해저관로 1.15km 포함)
- 사업기간 : 2021. 07. 12. ~ 2026. 12. 20.
- 사업시행자 : 한국농어촌공사 진도지사
- 시공회사 : 우진건설(주) 60%, 케이에스종합건설(주) 20%, 왕우건설(주) 20%
- 하도급사 : (유)씨에스이엔지, (주)한신건설

(단위 : 백만원)

구 분	총 계 획	'23년 까지	'24년 계획	'25년 이후
<b>&lt; 사업비 &gt;</b>	<b>40,482</b>	<b>26,300</b>	<b>5,994</b>	<b>8,188</b>
계 [진도]	40,482[100%]	26,300[79.9%]	5,994[18.2%]	8,188[1.9%]
○ 공 사 비	35,299	23,019	4,953	7,327
- 순 공 사 비	26,347	16,394	3,818	6,135
- 관급자재대	7,499	5,720	938	841
- 기타공사비	1,453	905	197	351
○ 보 상 비	1,667	798	635	234
○ 시설부대경비	3,516	2,483	406	627
<b>&lt; 주요공사 &gt;</b>				
○ 양 수 장	300mm×170Kw×2대	토목,전기,건축	토목,전기,건축	토목부지정리
○ 송수관로	1조 15.89km	11.33km	2.39km	2.20km
○ 해저관로	1차 슈팅 1.15km 1차 확공 1.15km 2차 확공 1.15km 3차 확공 1.15km	1차 슈팅 1.15km 1차 확공 1.15km 2차 확공 0.26km -	- - 2차 확공 0.71km -	- - 2차 확공 0.17km 3차 확공 1.15km
○ 부대공사	가설사무실 등	가설사무실, 시험비	시험비, 안전관리비	시험비, 안전관리비

## ■ 위치 평면도

위치 : 전남 진도군 진도읍, 군내면, 군내면, 해남군 문내면 일원

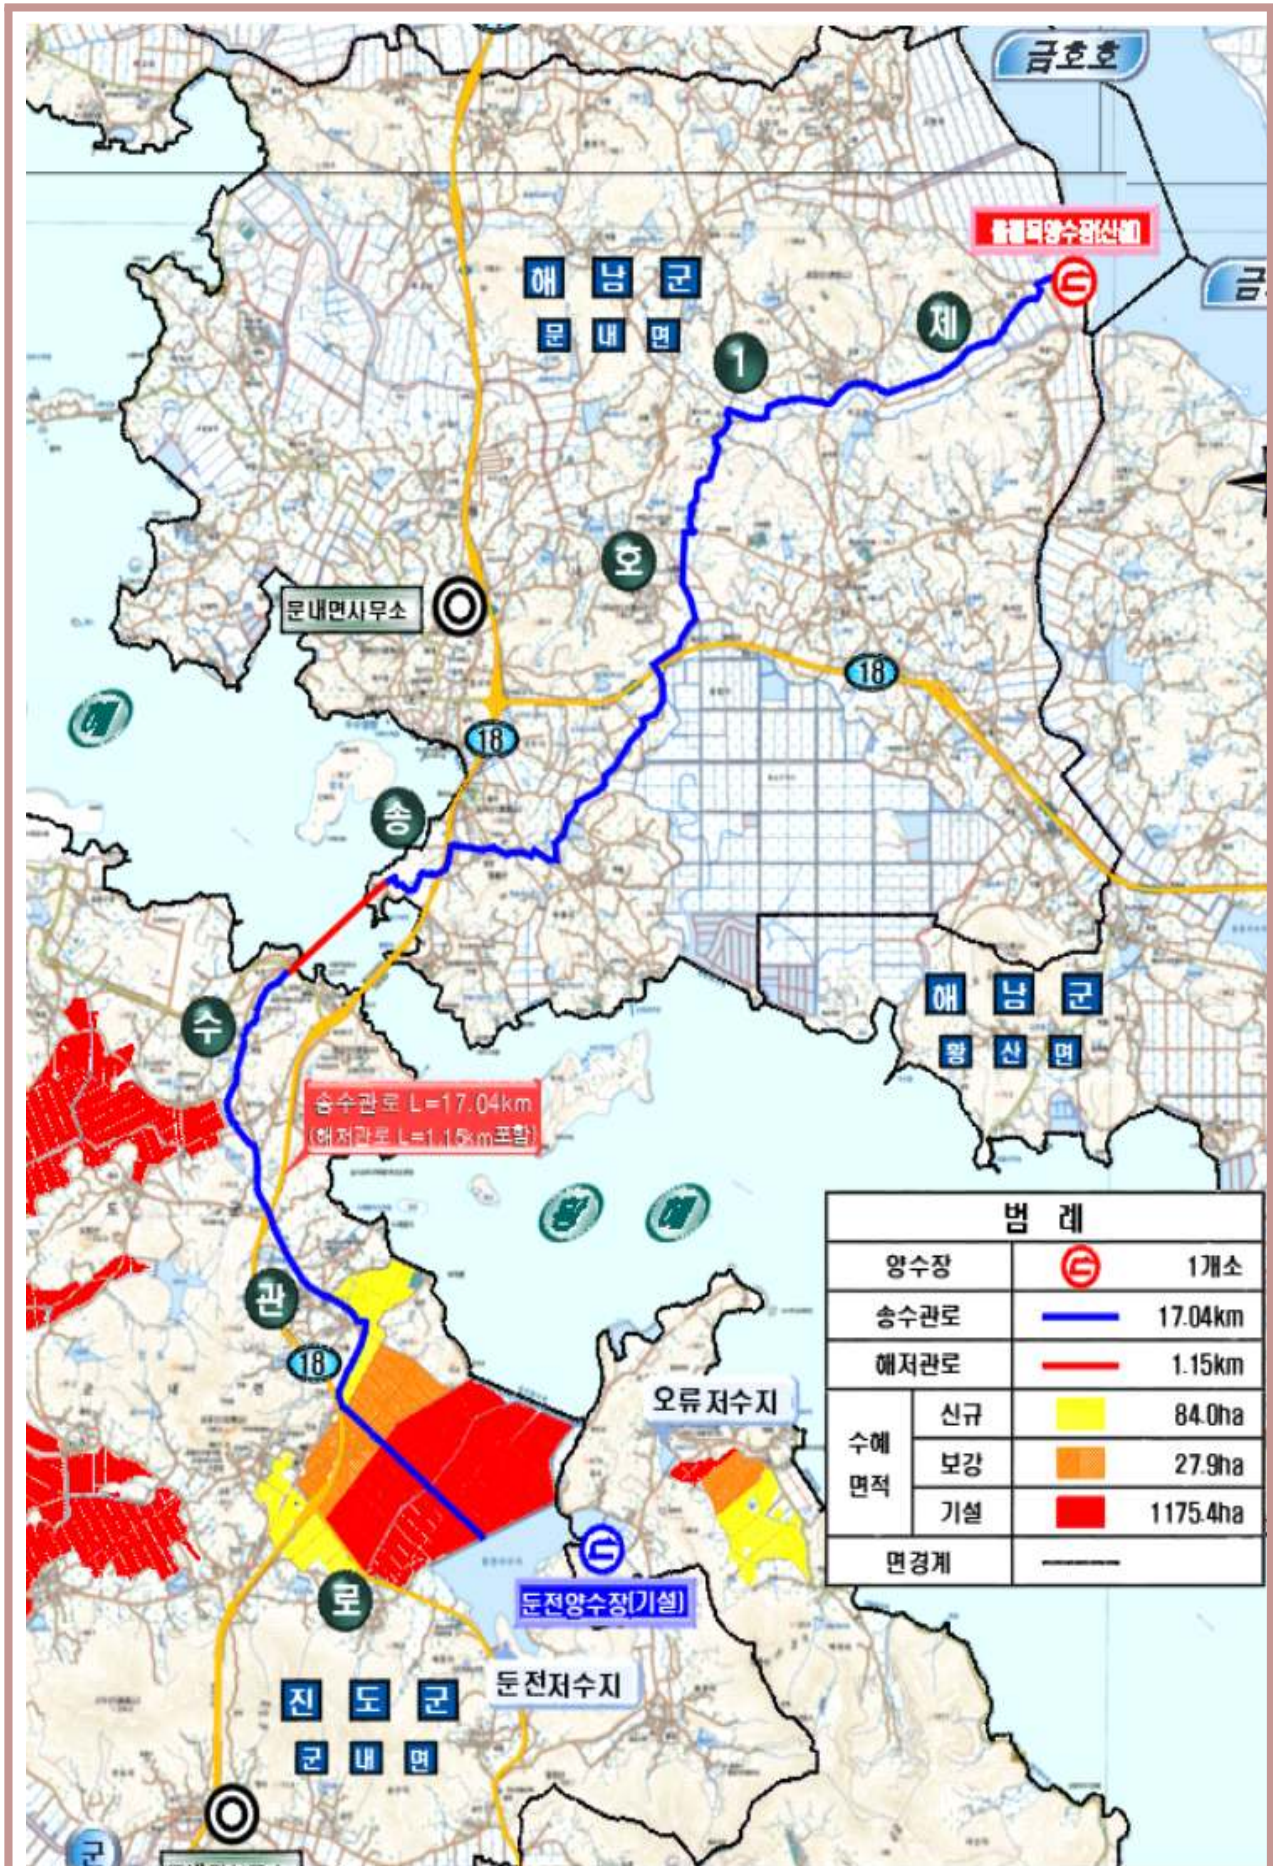

## ■ 그동안 추진사항


- 2017. 12. : 국회 지구지정
- 2018. 01. : 예정지 답사 지시
- 2019. 06. : 기본계획 수립
- 2019. 07. : 세부설계 착수
- 2020. 11. 20. : 시행계획 승인
- 2021. 06. 21. : 공사계약
- 2021. 07. 12 : 공사착공
- 2023. 12. 28 : 시행계획변경승인(평야부노선변경)

## ■ 참고 도면 및 사진

### 1. 울돌목양수장 일반도



## 2. 송수관로 대표 횡단면도

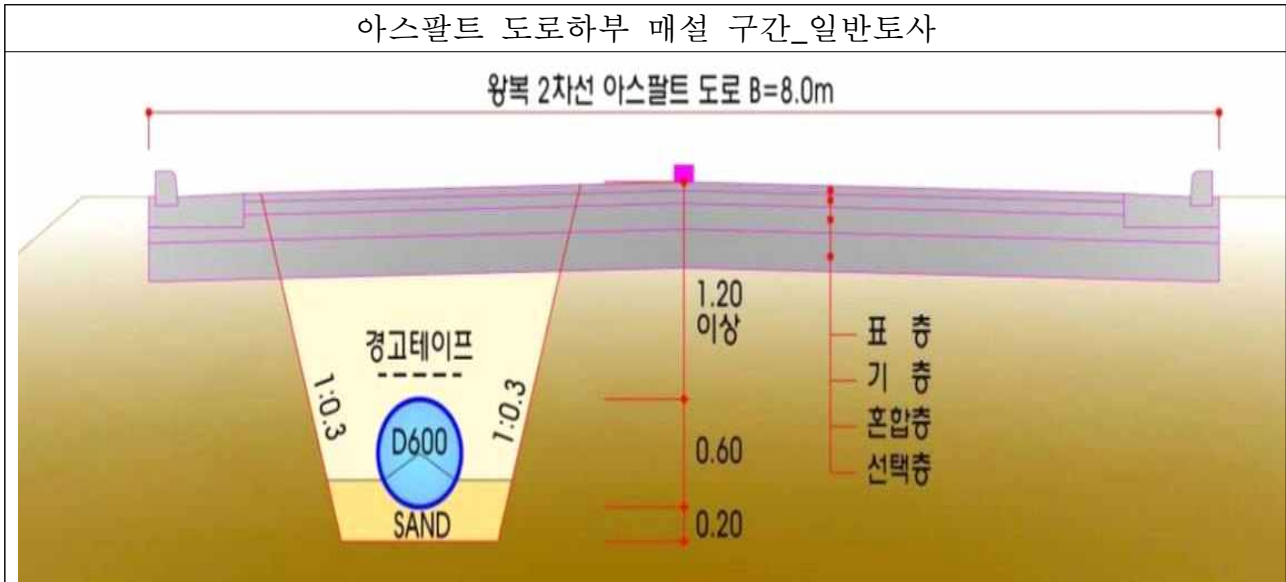

## 3. 해저관로 노선도



#### 4. 사진대지

양수장 인입수문 시공중



양수장 토출수조 시공중



양수장 기계실 시공중



양수장 건축 시공중



해저관로 종점부(해남)



해저관로 시공중

